

Gestão de Projetos 2026

Prof. MS Clayton J A Silva

Gestão do escopo de projetos

Gerenciamento do escopo

- Inclui todas as atividades de gestão necessárias para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e **apenas o necessário**, para encerrar o projeto com sucessos.
- Relaciona-se principalmente com a definição e controle **do que está e não está** incluso no projeto.
- **Escopo do produto:** características e funções que definem um produto, serviço ou resultado;
- **Escopo do projeto:** trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado de acordo com as características e funções especificadas.

GERENCIAMENTO DO ESCOPO — VISÃO DO PMBOK



ESCOPO DO PRODUTO

Características e funções da entrega




ESCOPO DO PROJETO

Trabalho necessário para produzir a entrega

Plano de gerenciamento do escopo

- ✓ Criação da EAP e como a EAP será mantida;
- ✓ Como será obtida a aceitação formal das entregas;
- ✓ Controle das solicitações de mudança do escopo.
- ✓ Priorização dos requisitos;
- ✓ Métricas do produto e a justificativa pela sua adoção;
- ✓ Estrutura de rastreabilidade que reflita quais atributos serão capturados na matriz de rastreabilidade;

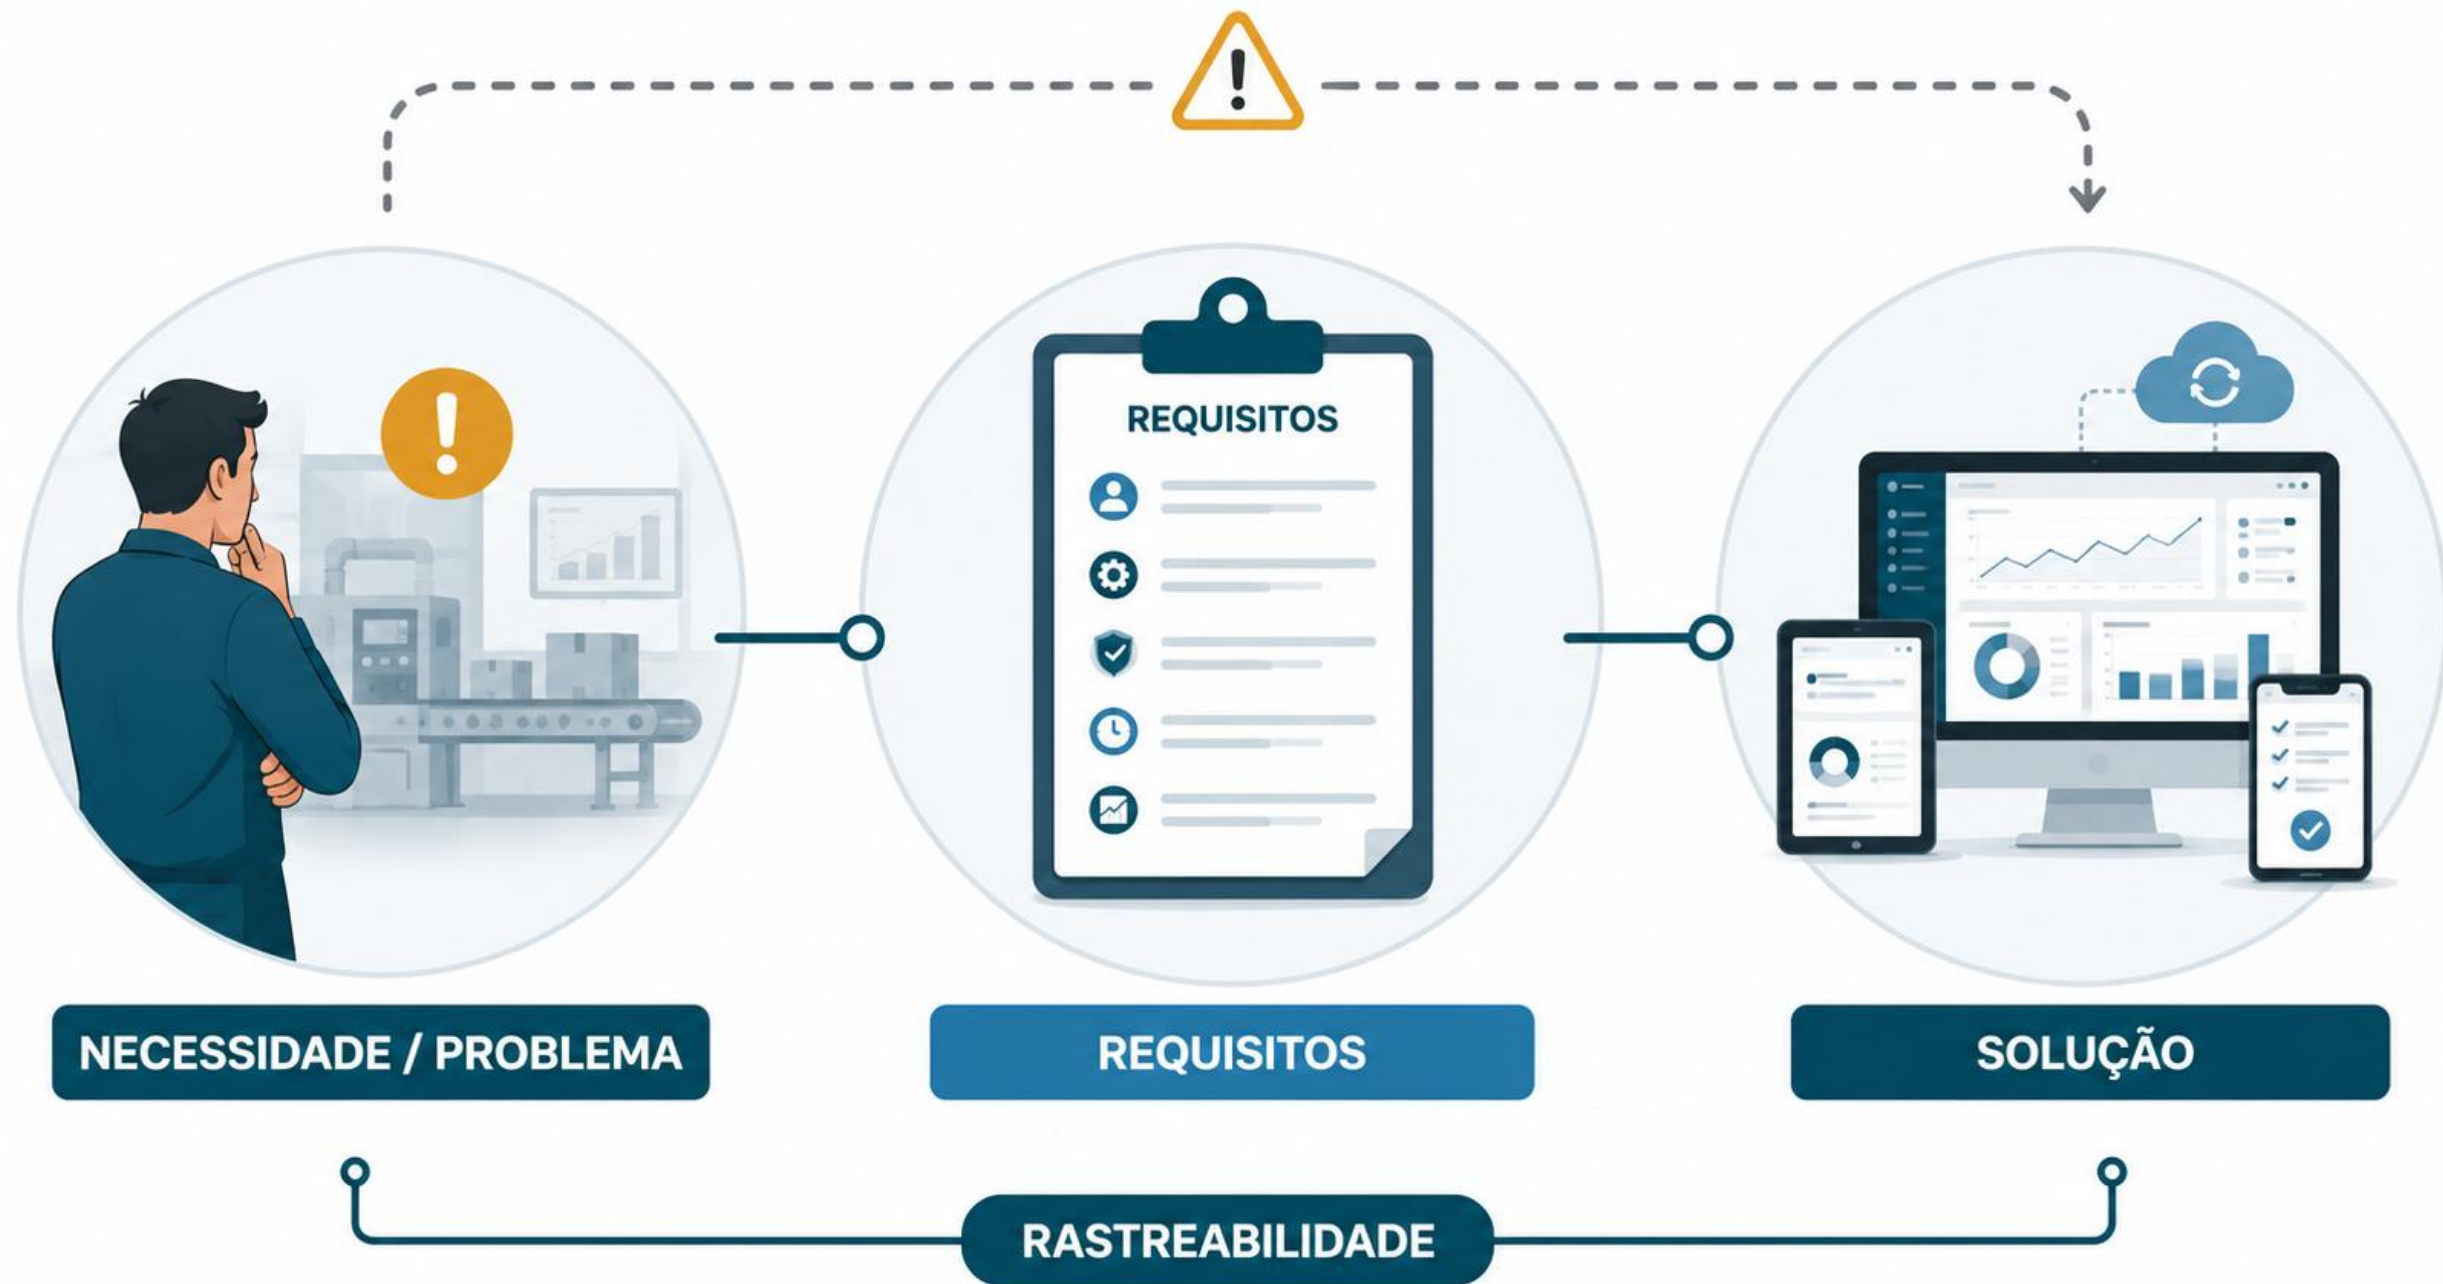

TIPOS DE REQUISITOS




OPERACIONAIS



FUNCIONAIS



NÃO FUNCIONAIS

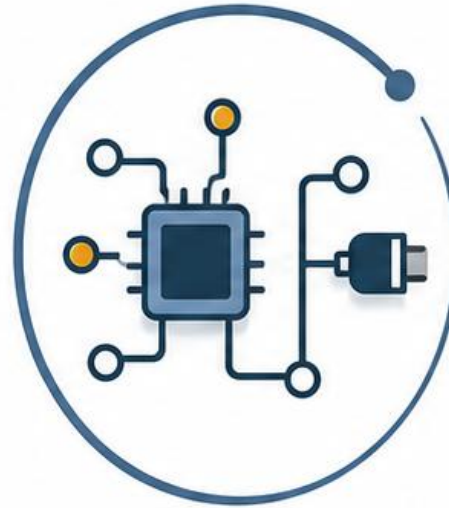


TÉCNICOS



NORMATIVOS

DESCOBERTA E REFINAMENTO DE REQUISITOS

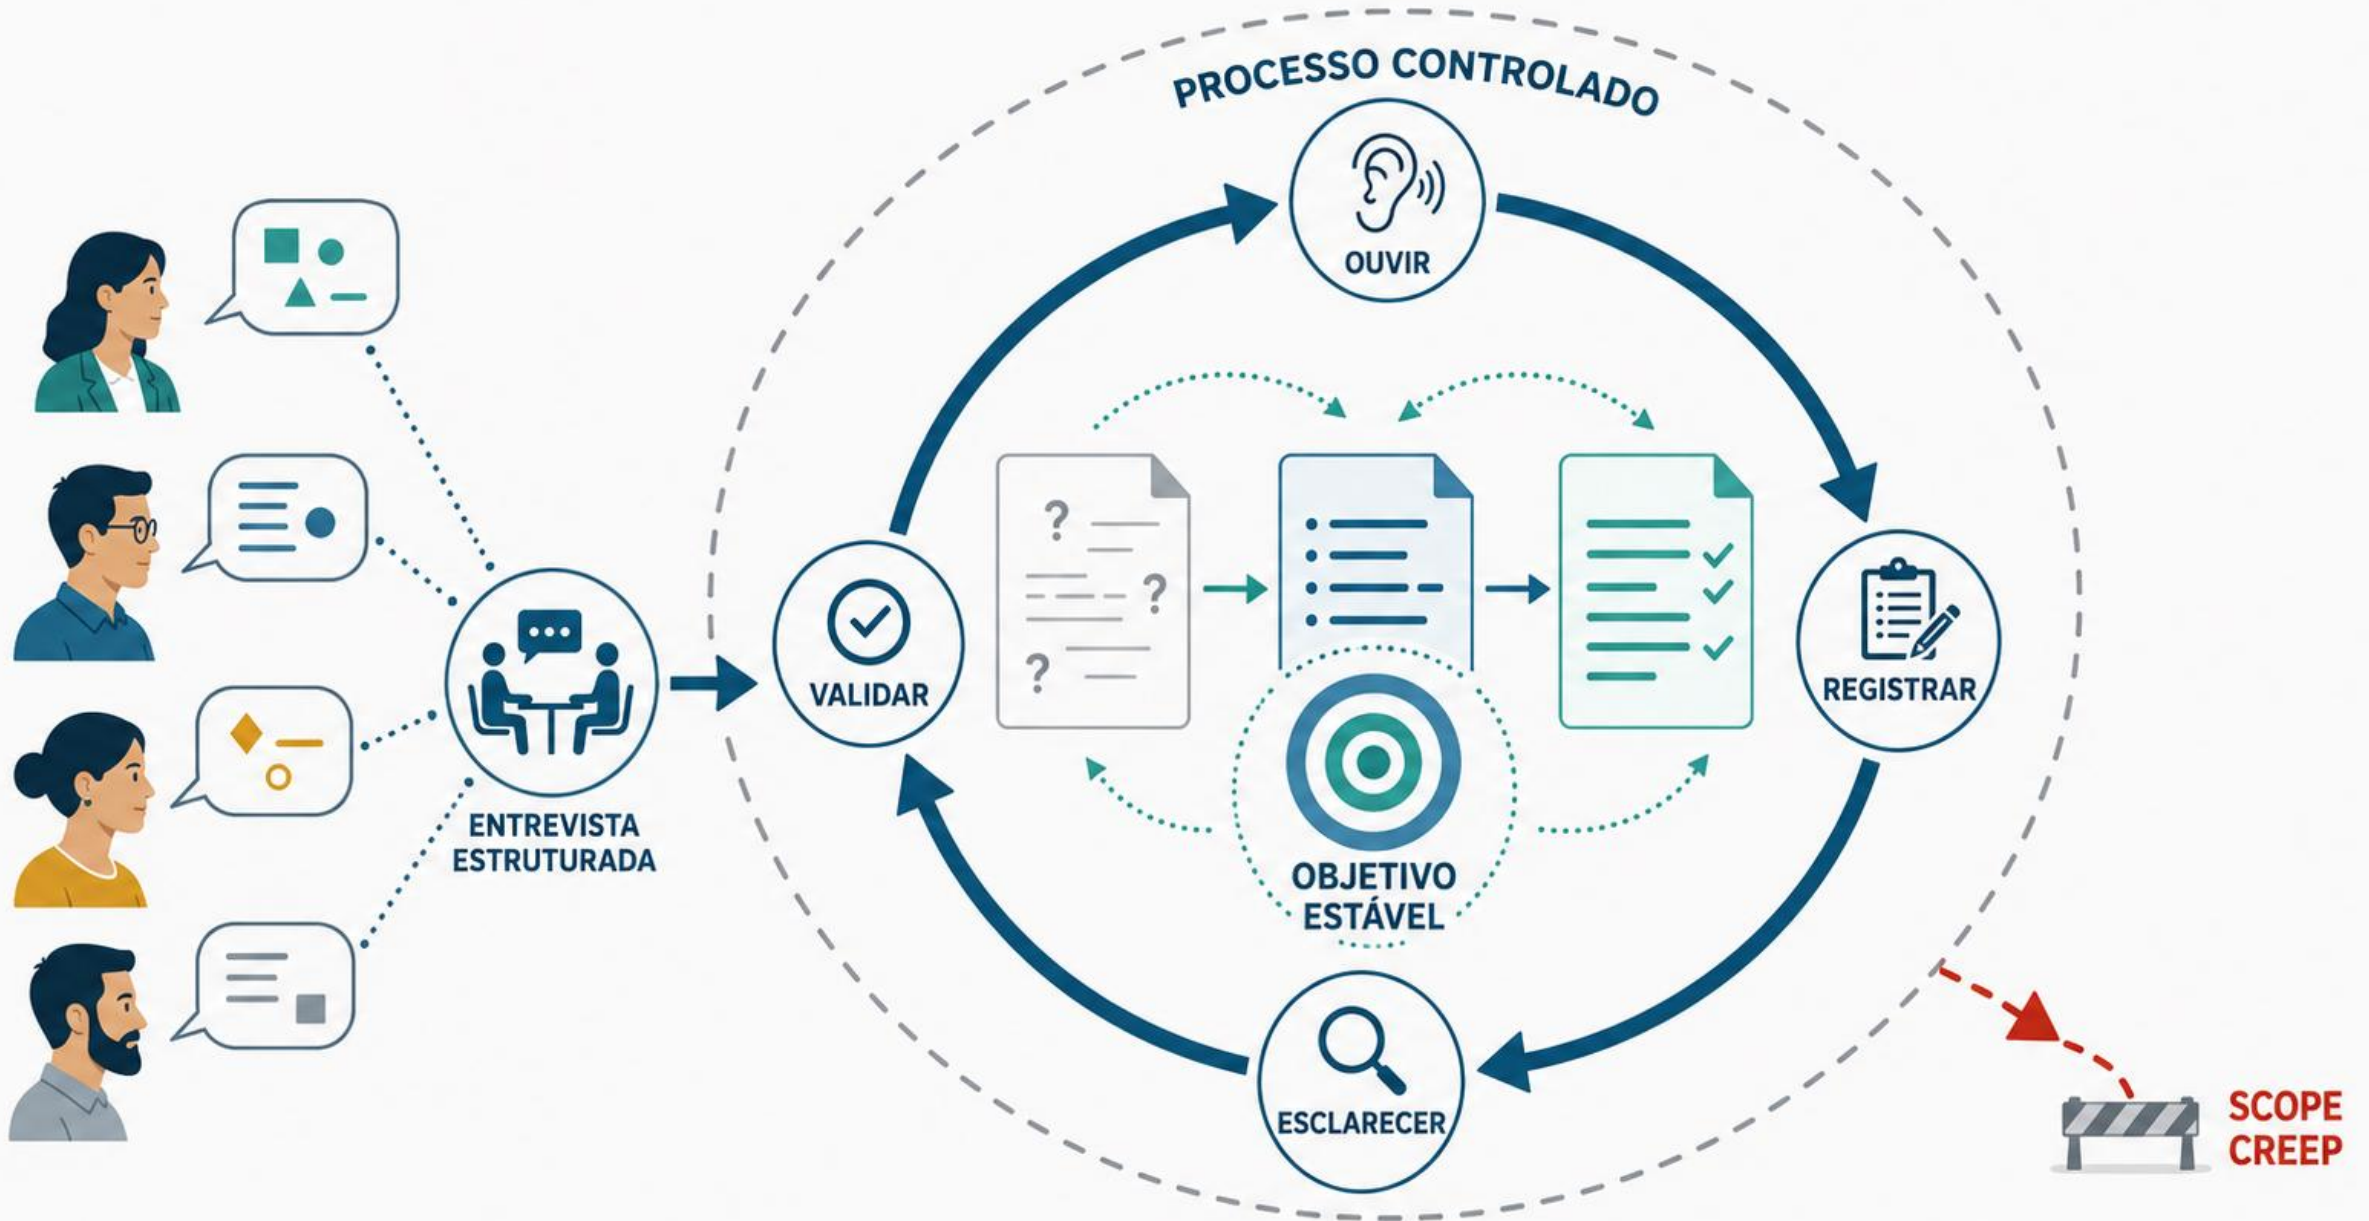


BENCHMARKING E ATUALIZAÇÃO DO ESCOPO



Comparar alternativas amplia a compreensão do problema.

Revisar nas entregas intermediárias reduz a defasagem.

Problemas identificados tardiamente na integração podem ter sua origem em decisões tomadas ainda na definição dos requisitos.

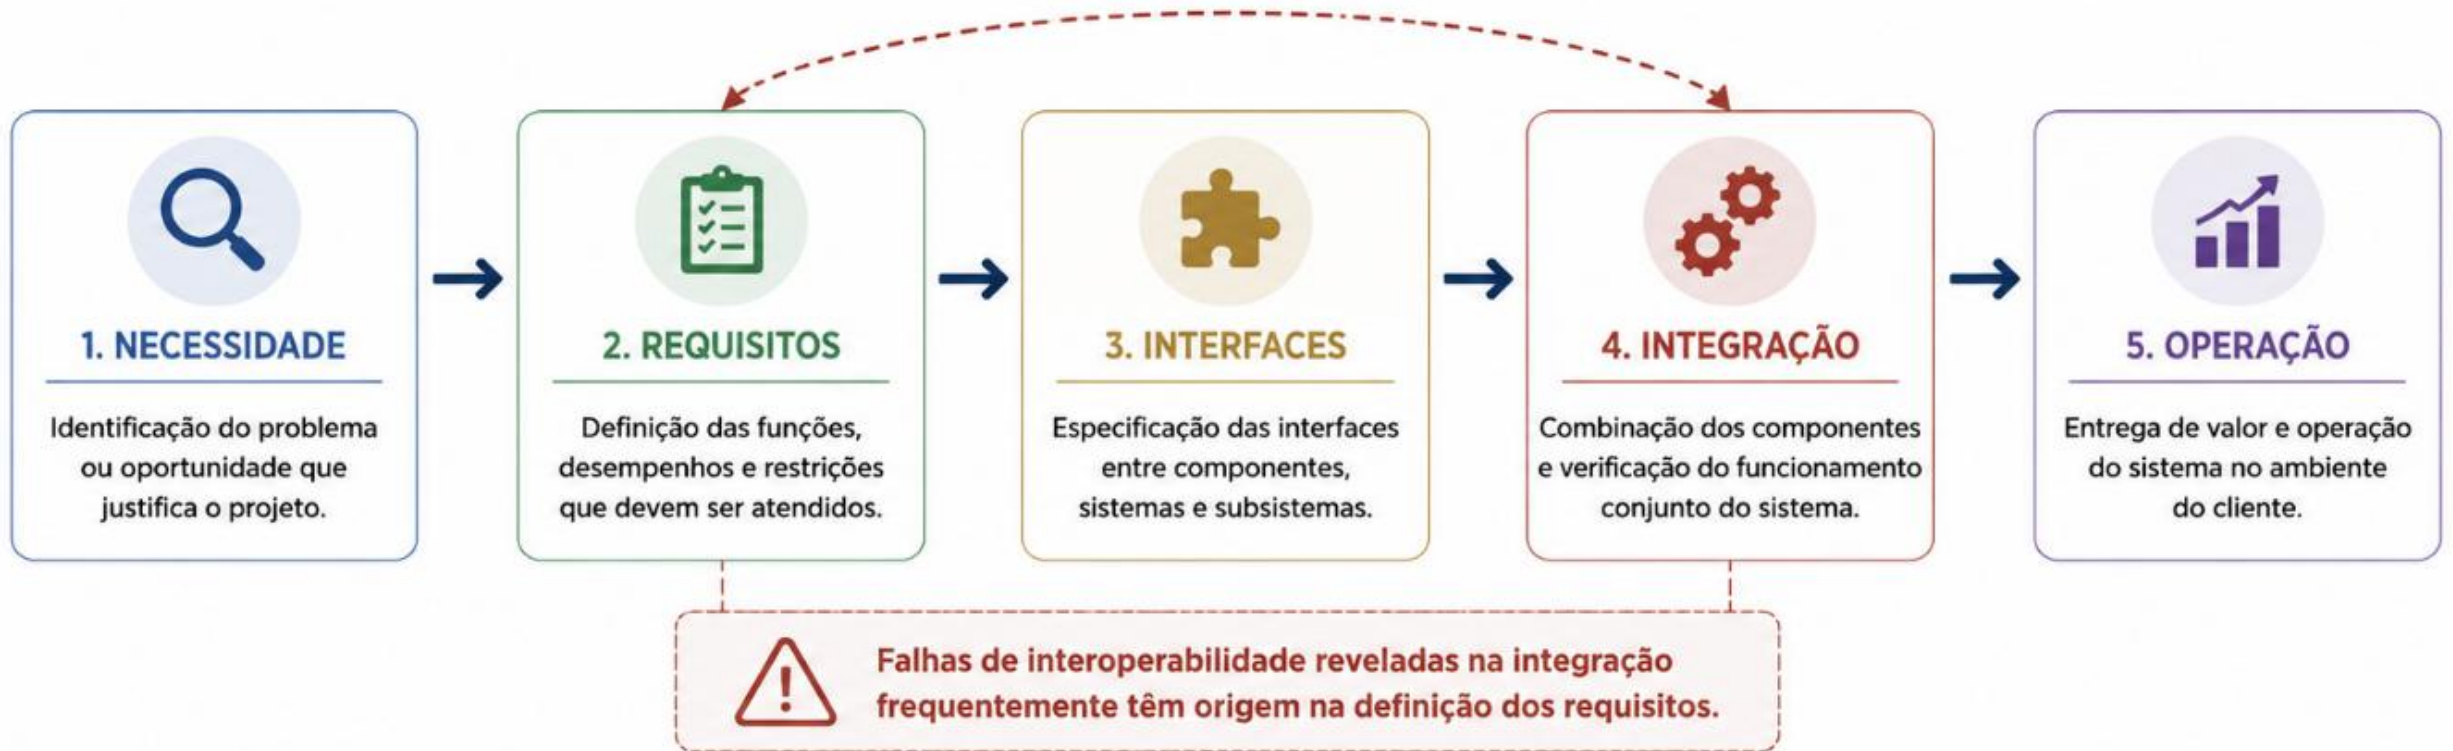


MENSAGEM-CHAVE


Investir tempo e rigor na definição de requisitos e interfaces é fundamental para garantir a interoperabilidade, reduzir retrabalho e assegurar o sucesso do projeto.



ARTEFATOS PARA DELIMITAR E PROTEGER O ESCOPO

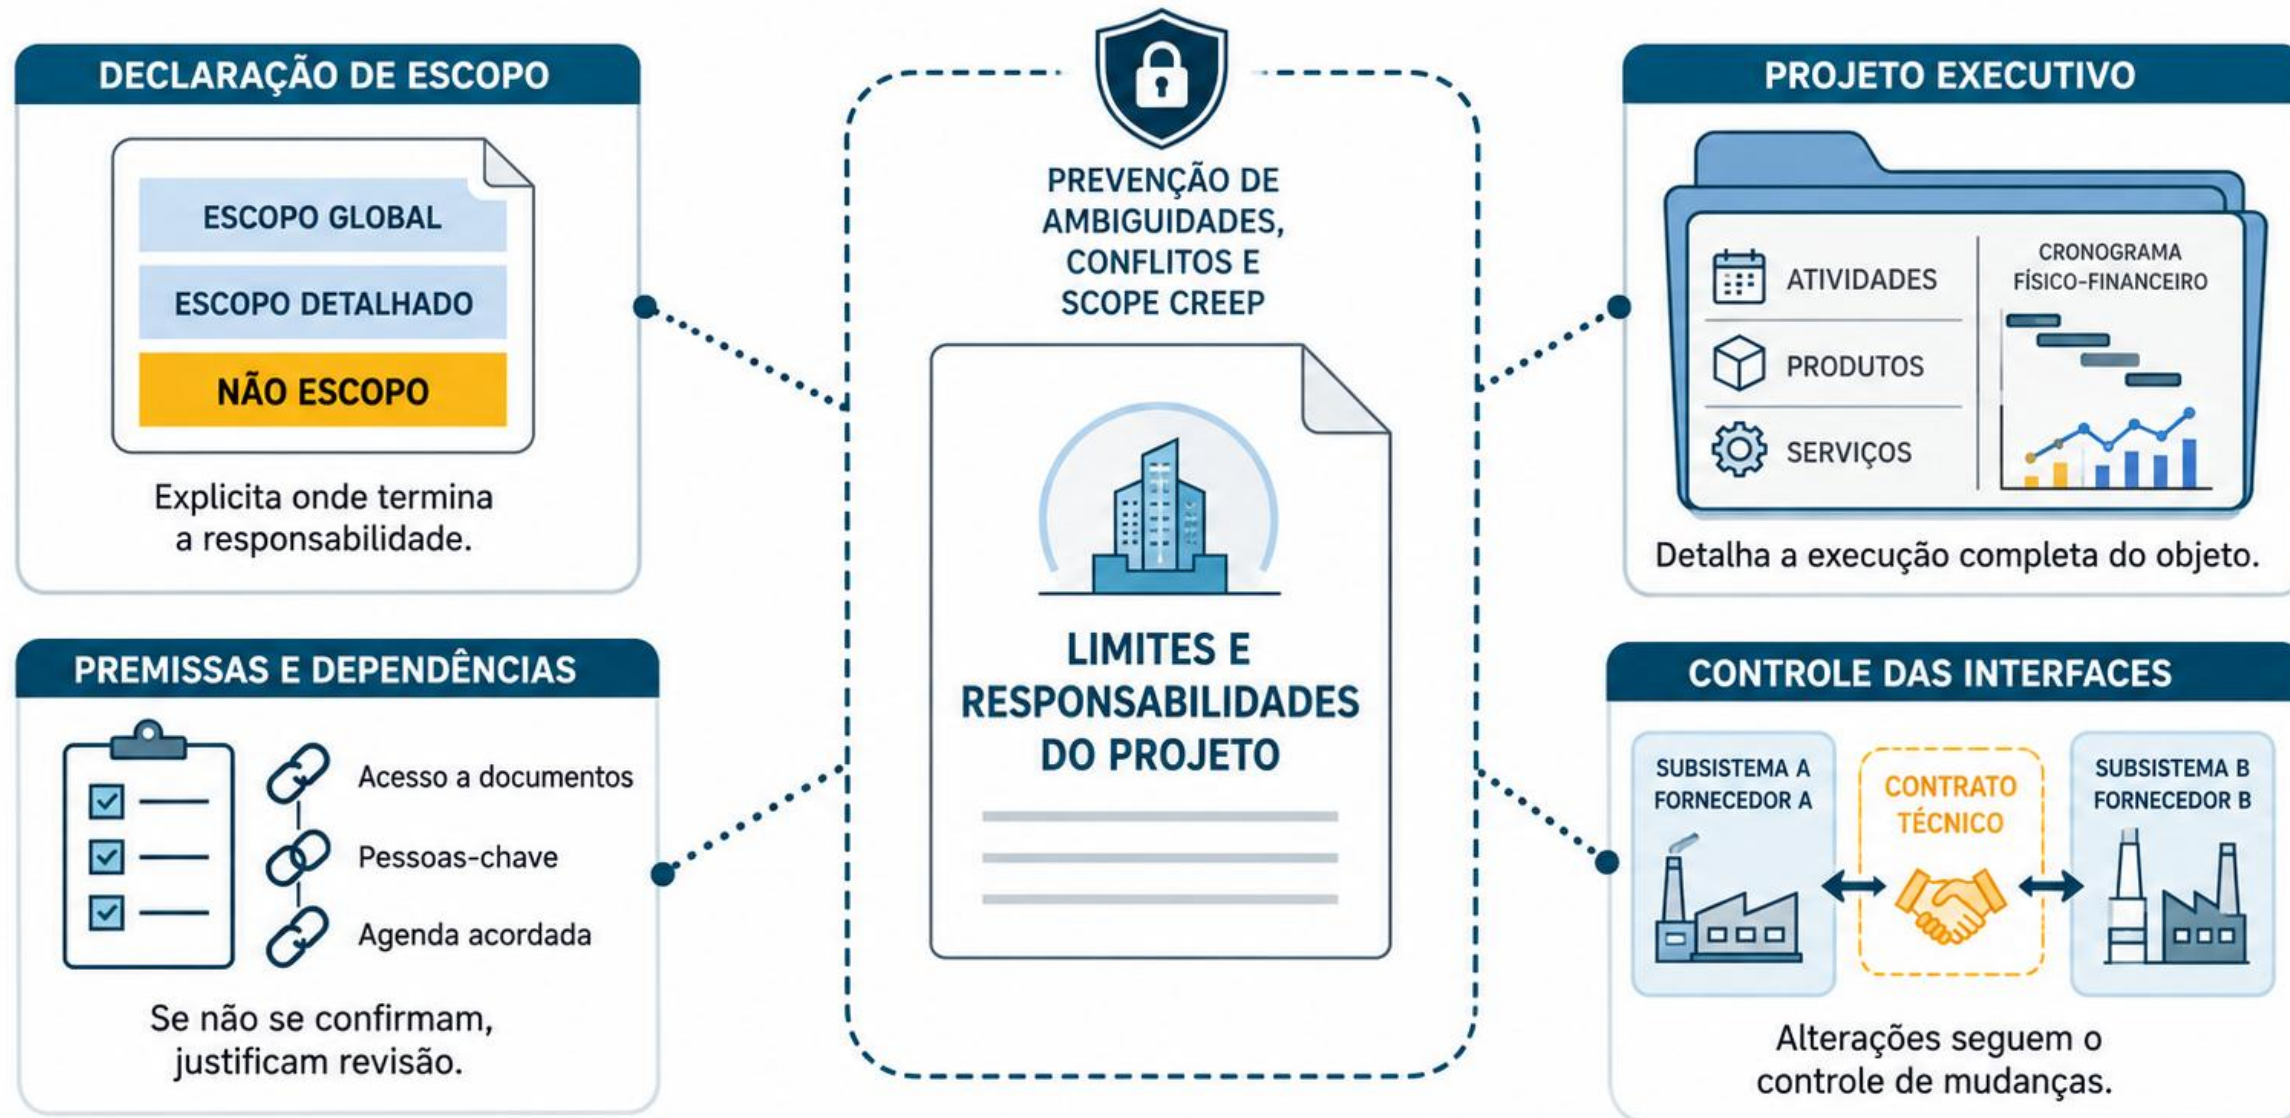

Projeto: Desenvolvimento de Website Institucional

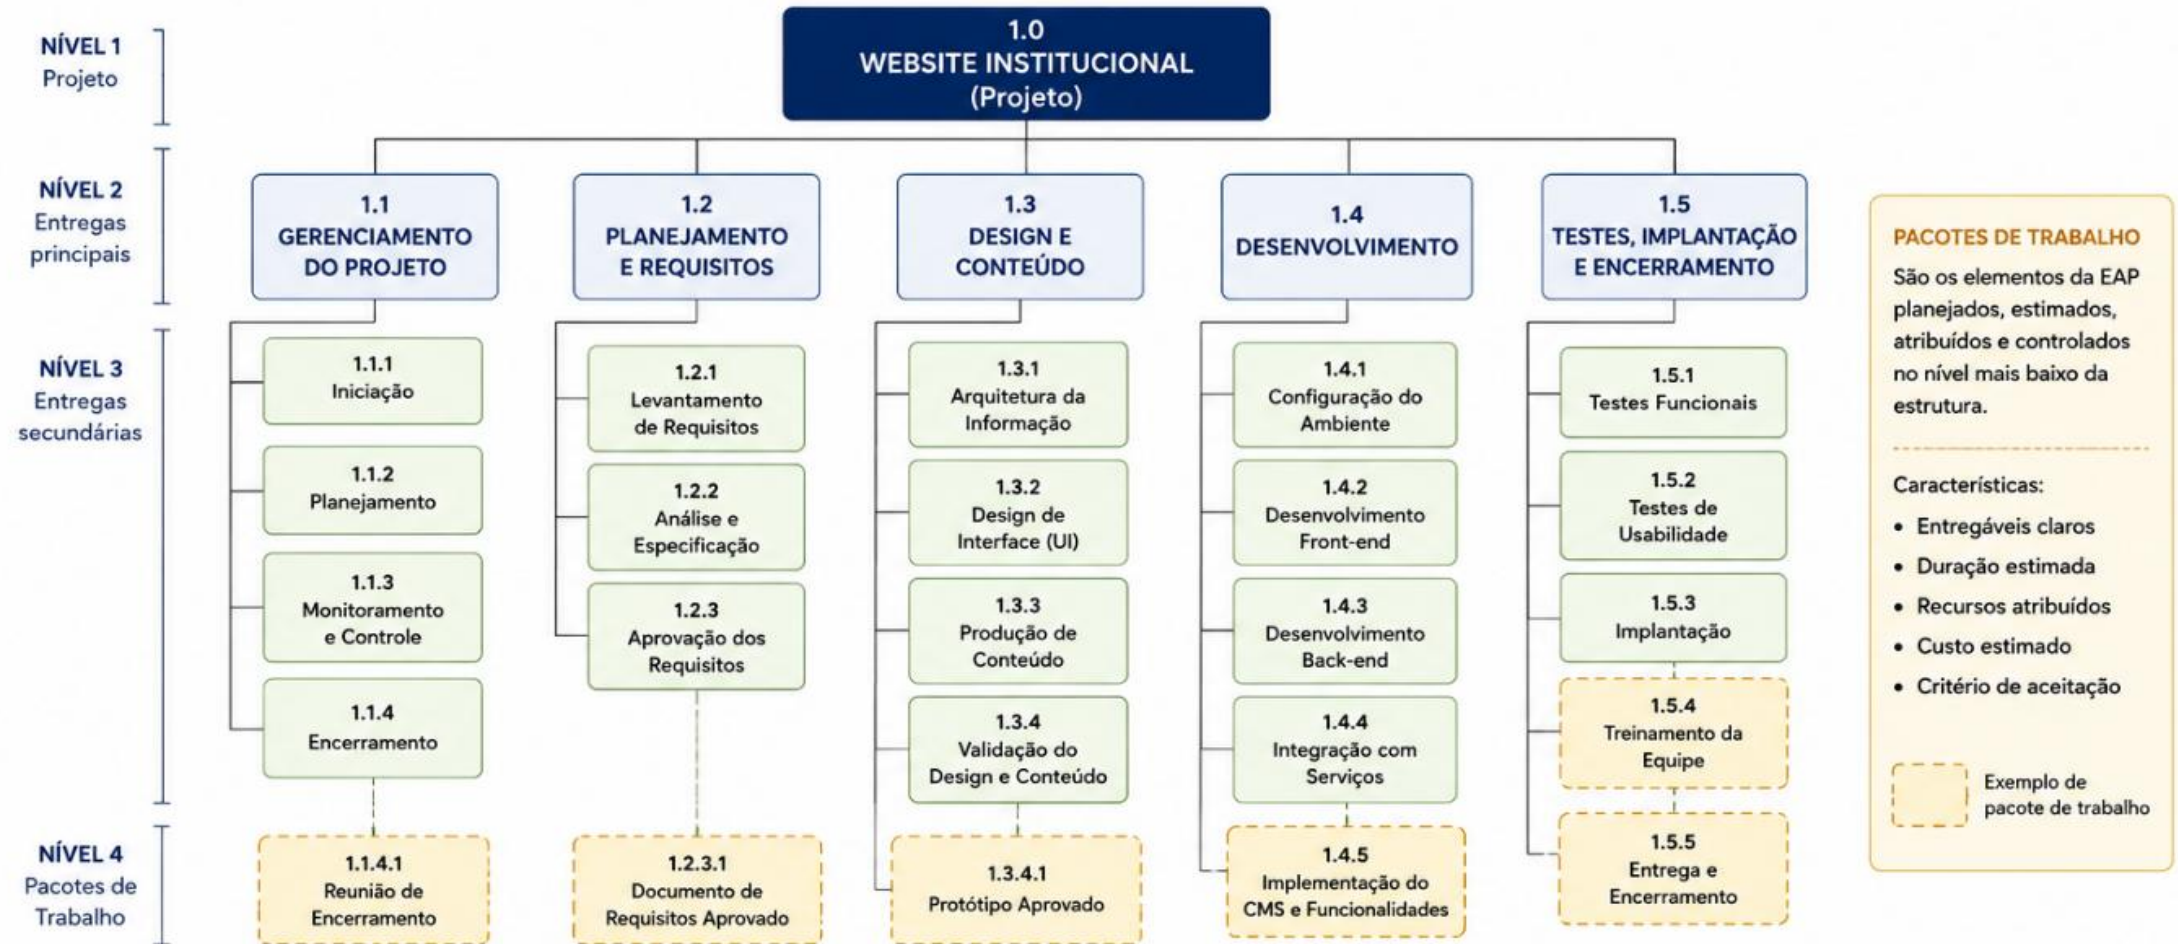

LEGENDA

- Nível 1 – Projeto
- Nível 2 – Entregas principais
- Nível 3 – Entregas secundárias
- Nível 4 – Pacotes de trabalho

DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS

- Código da EAP: identificação única de cada elemento.
- Nome do elemento: descrição da entrega ou atividade.
- Decomposição: cada elemento é decomposto no próximo nível inferior.
- Regra dos 100%: o somatório dos elementos de um nível deve representar 100% do nível acima.
- Orientação: entregas orientadas a resultados e não a atividades.

EXEMPLO DE CÓDIGO DA EAP



! Esta EAP é um exemplo ilustrativo de um projeto simples. Em projetos reais, o nível de detalhamento deve ser adequado à complexidade, ao tamanho e à abordagem adotada.



Controle do escopo

- Busca assegurar que o trabalho executado permaneça aderente ao planejamento aprovado.
- Alterações sucessivas e não controladas podem comprometer progressivamente custo, prazo, qualidade e desempenho do empreendimento.
- *scope creep* — o **crescimento gradual e não controlado do escopo**, normalmente decorrente da aceitação informal de pequenas solicitações de mudança sem avaliação formal de impacto — e
- *gold plating* — a **inclusão de funcionalidades não solicitadas pelo cliente**, geralmente motivada pelo entusiasmo técnico da própria equipe de desenvolvimento, e que consome recursos sem gerar valor correspondente.

