GESTÃO DE PROJETOS

Gestão de Pessoas e Equipes de Projeto

Unidade 6

Prof. Clayton J A Silva

Introdução

A equipe e o cronograma amadurecem juntos

- O escopo e o cronograma já indicam o trabalho a realizar. O planejamento da equipe começa pela identificação das **competências** exigidas por esse trabalho.
- A definição de **perfis**, **estrutura da equipe** e **responsabilidades** permite estimar **quantas pessoas** mobilizar e **em que momento** cada uma será necessária.
- A relação é recíproca: a disponibilidade da equipe altera os prazos viáveis, enquanto mudanças no cronograma modificam a necessidade de pessoas.

Introdução

A equipe sustenta as próximas decisões de gestão

- Os perfis e seus períodos de alocação permitem **estimar custos de pessoal** e preparar o **orçamento** com base no trabalho planejado.
- A falta de uma competência crítica ou a dependência de uma contratação precisa entrar na análise de riscos e nas decisões de prazo.
- Responsabilidades claras e coordenação entre especialidades apoiam a qualidade das entregas. Por isso, **equipe, escopo, tempo e custos precisam permanecer coerentes – gestão da integração.**

Para construir essa coerência, primeiro precisamos definir o que significa competência.

Competências e Perfis Profissionais

Conhecimento, habilidade e atitude

- **Conhecimento** é o saber teórico e técnico acumulado. No portal de atendimento que usaremos como exemplo, inclui conhecer requisitos de segurança e regras do serviço.

- **Habilidade** é a capacidade de aplicar esse saber. Um profissional pode conhecer uma técnica e ainda precisar desenvolver prática para utilizá-la com qualidade.

- **Atitude** é a disposição para agir, colaborar e assumir responsabilidades. As três dimensões se complementam no desempenho de uma atividade.

O **modelo CHA** permite descrever a competência antes de escolher quem ocupará a posição.

Modelo CHA (Conhecimento, Habilidade, Atitude) na composição da competência individual



Competências e Perfis Profissionais

O perfil descreve a necessidade da posição

Um **perfil** reúne as competências técnicas e comportamentais necessárias a uma posição na equipe. A pessoa é o profissional que poderá ocupar essa posição.

Definir o perfil antes da seleção evita que o projeto seja organizado apenas em torno das pessoas imediatamente disponíveis.




Depois de descrever cada perfil, avaliamos como reunir as competências do projeto.

Competências e Perfis Profissionais

A avaliação considera o conjunto de competências

- Formação, certificações e experiências anteriores ajudam a avaliar competências técnicas, mas é importante considerar a proximidade dessas experiências com o trabalho previsto.
- Competências comportamentais exigem observar como o profissional decide, comunica e colabora, conforme as exigências da posição.
- **Projetos multidisciplinares combinam especialidades que uma pessoa não reúne sozinha**.
- A **estrutura organizacional** distribui essas competências e define como elas atuarão juntas.

Assim, o próximo passo é organizar as competências a partir das entregas.

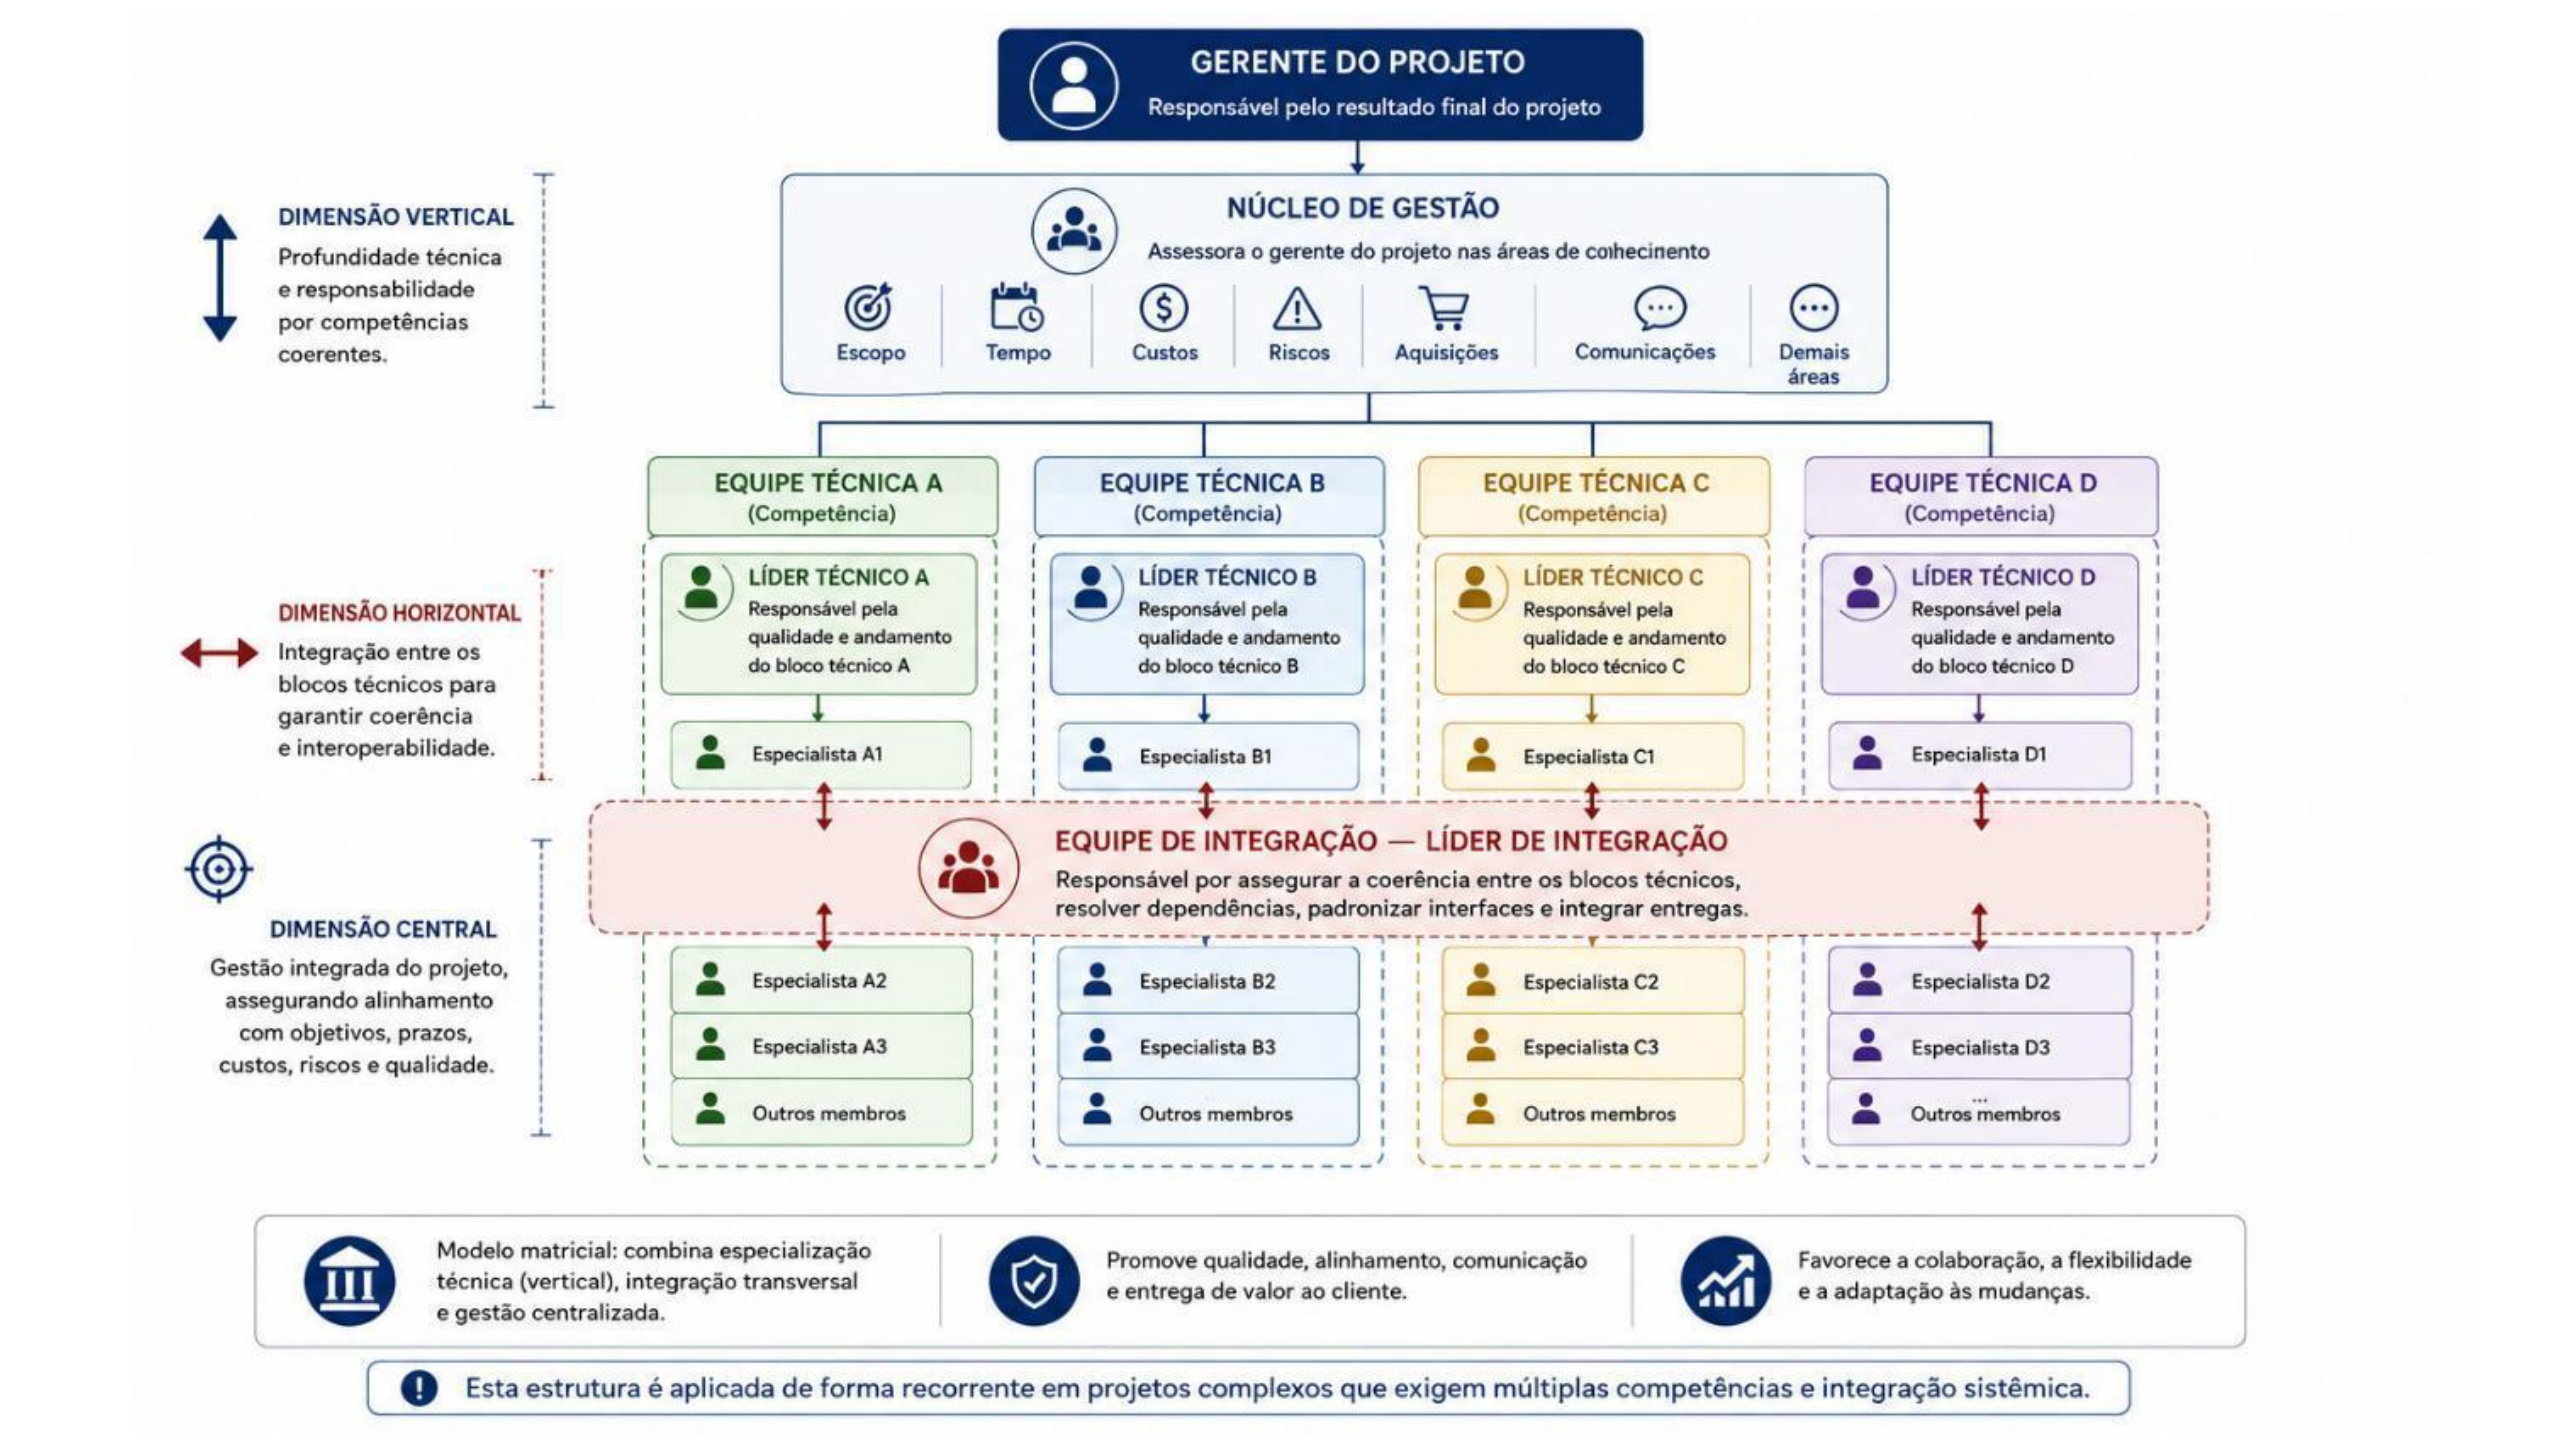
GERENTE DO PROJETO
Responsável pelo resultado final do projeto
DIMENSÃO VERTICAL
Profundidade técnica e responsabilidade por competências coerentes.
NÚCLEO DE GESTÃO
Assessora o gerente do projeto nas áreas de conhecimento
Escopo
Tempo
Custos
Riscos
Aquisições
Comunicações
Demais áreas
EQUIPE TÉCNICA A
(Competência)
EQUIPE TÉCNICA B
(Competência)
EQUIPE TÉCNICA C
(Competência)
EQUIPE TÉCNICA D
(Competência)
DIMENSÃO HORIZONTAL
Integração entre os blocos técnicos para garantir coerência e interoperabilidade.
LÍDER TÉCNICO A
Responsável pela qualidade e andamento do bloco técnico A
LÍDER TÉCNICO B
Responsável pela qualidade e andamento do bloco técnico B
LÍDER TÉCNICO C
Responsável pela qualidade e andamento do bloco técnico C
LÍDER TÉCNICO D
Responsável pela qualidade e andamento do bloco técnico D
Especialista A1
Especialista B1
Especialista C1
Especialista D1
EQUIPE DE INTEGRAÇÃO — LÍDER DE INTEGRAÇÃO
Responsável por assegurar a coerência entre os blocos técnicos, resolver dependências, padronizar interfaces e integrar entregas.
DIMENSÃO CENTRAL
Gestão integrada do projeto, assegurando alinhamento com objetivos, prazos, custos, riscos e qualidade.
Especialista A2
Especialista A3
Outros membros
Especialista B2
Especialista B3
Outros membros
Especialista C2
Especialista C3
Outros membros
Especialista D2
Especialista D3
Outros membros
Modelo matricial: combina especialização técnica (vertical), integração transversal e gestão centralizada.
Promove qualidade, alinhamento, comunicação e entrega de valor ao cliente.
Favorece a colaboração, a flexibilidade e a adaptação às mudanças.
Esta estrutura é aplicada de forma recorrente em projetos complexos que exigem múltiplas competências e integração sistêmica.

Matriz de competências por função

Competências necessárias para exercer uma função e assumir suas responsabilidades

Função	Responsabilidades	Conhecimentos técnicos	Habilidades práticas	Atitudes e comportamentos
Analista de requisitos	Levantar necessidades e especificar requisitos claros e verificáveis.	Processos do negócio e técnicas de requisitos.	Entrevistar usuários, analisar necessidades e redigir especificações.	Escuta ativa, rigor e colaboração.
Especialista em testes	Verificar as entregas e registrar falhas com evidências.	Técnicas de teste e critérios de aceitação.	Planejar testes, executar verificações e analisar resultados.	Atenção aos detalhes, disciplina e responsabilidade.
Líder de integração	Coordenar interfaces e assegurar a coerência entre as entregas das equipes.	Arquitetura do sistema, interfaces e padrões técnicos.	Negociar soluções, mediar conflitos e integrar decisões.	Cooperação, abertura ao diálogo e compromisso com o conjunto.

O perfil profissional reúne essas competências. A seleção e o desenvolvimento das pessoas consideram as exigências da função.

Exemplo didático: as competências devem ser ajustadas ao contexto e às entregas de cada projeto.

Estrutura Organizacional do Projeto


Os pacotes de trabalho orientam a organização

A EAP identifica as entregas do projeto. **A análise de seus pacotes de trabalho** revela as especialidades necessárias.

O critério é a coerência entre competências e entregas. As **interfaces** entre os grupos também precisam de coordenação explícita.

As equipes técnicas assumem blocos de trabalho e respondem pela qualidade de sua especialidade. Cada equipe conta com uma **liderança técnica**.

A equipe de integração coordena interfaces e mantém a coerência entre os resultados das disciplinas.

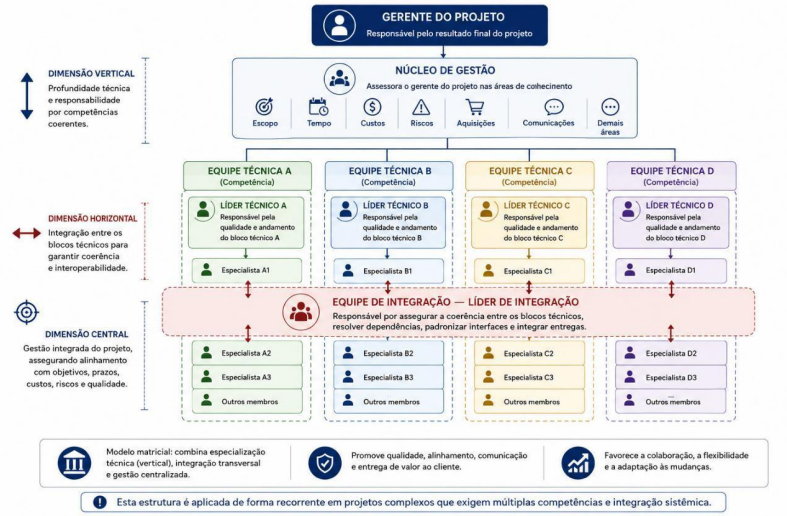

O **núcleo de gestão** apoia o gerente em escopo, tempo, custos, riscos e demais áreas. A separação das funções torna a coordenação uma responsabilidade definida.

A estrutura precisa contemplar a execução técnica, a integração e o apoio à gestão.


Dimensionamento da Equipe

A quantidade depende do trabalho e do momento

- O dimensionamento combina os perfis da estrutura com a demanda de atividades no cronograma. O resultado indica **quantidade**, **início** e **duração** de cada alocação.
- Mobilizar cedo demais gera ociosidade e custos. Mobilizar tarde demais pode atrasar atividades e comprometer entregas dependentes.

O mapa de alocação temporal torna visíveis essas decisões ao longo do projeto.

Alocação temporal dos perfis ao longo do cronograma do projeto

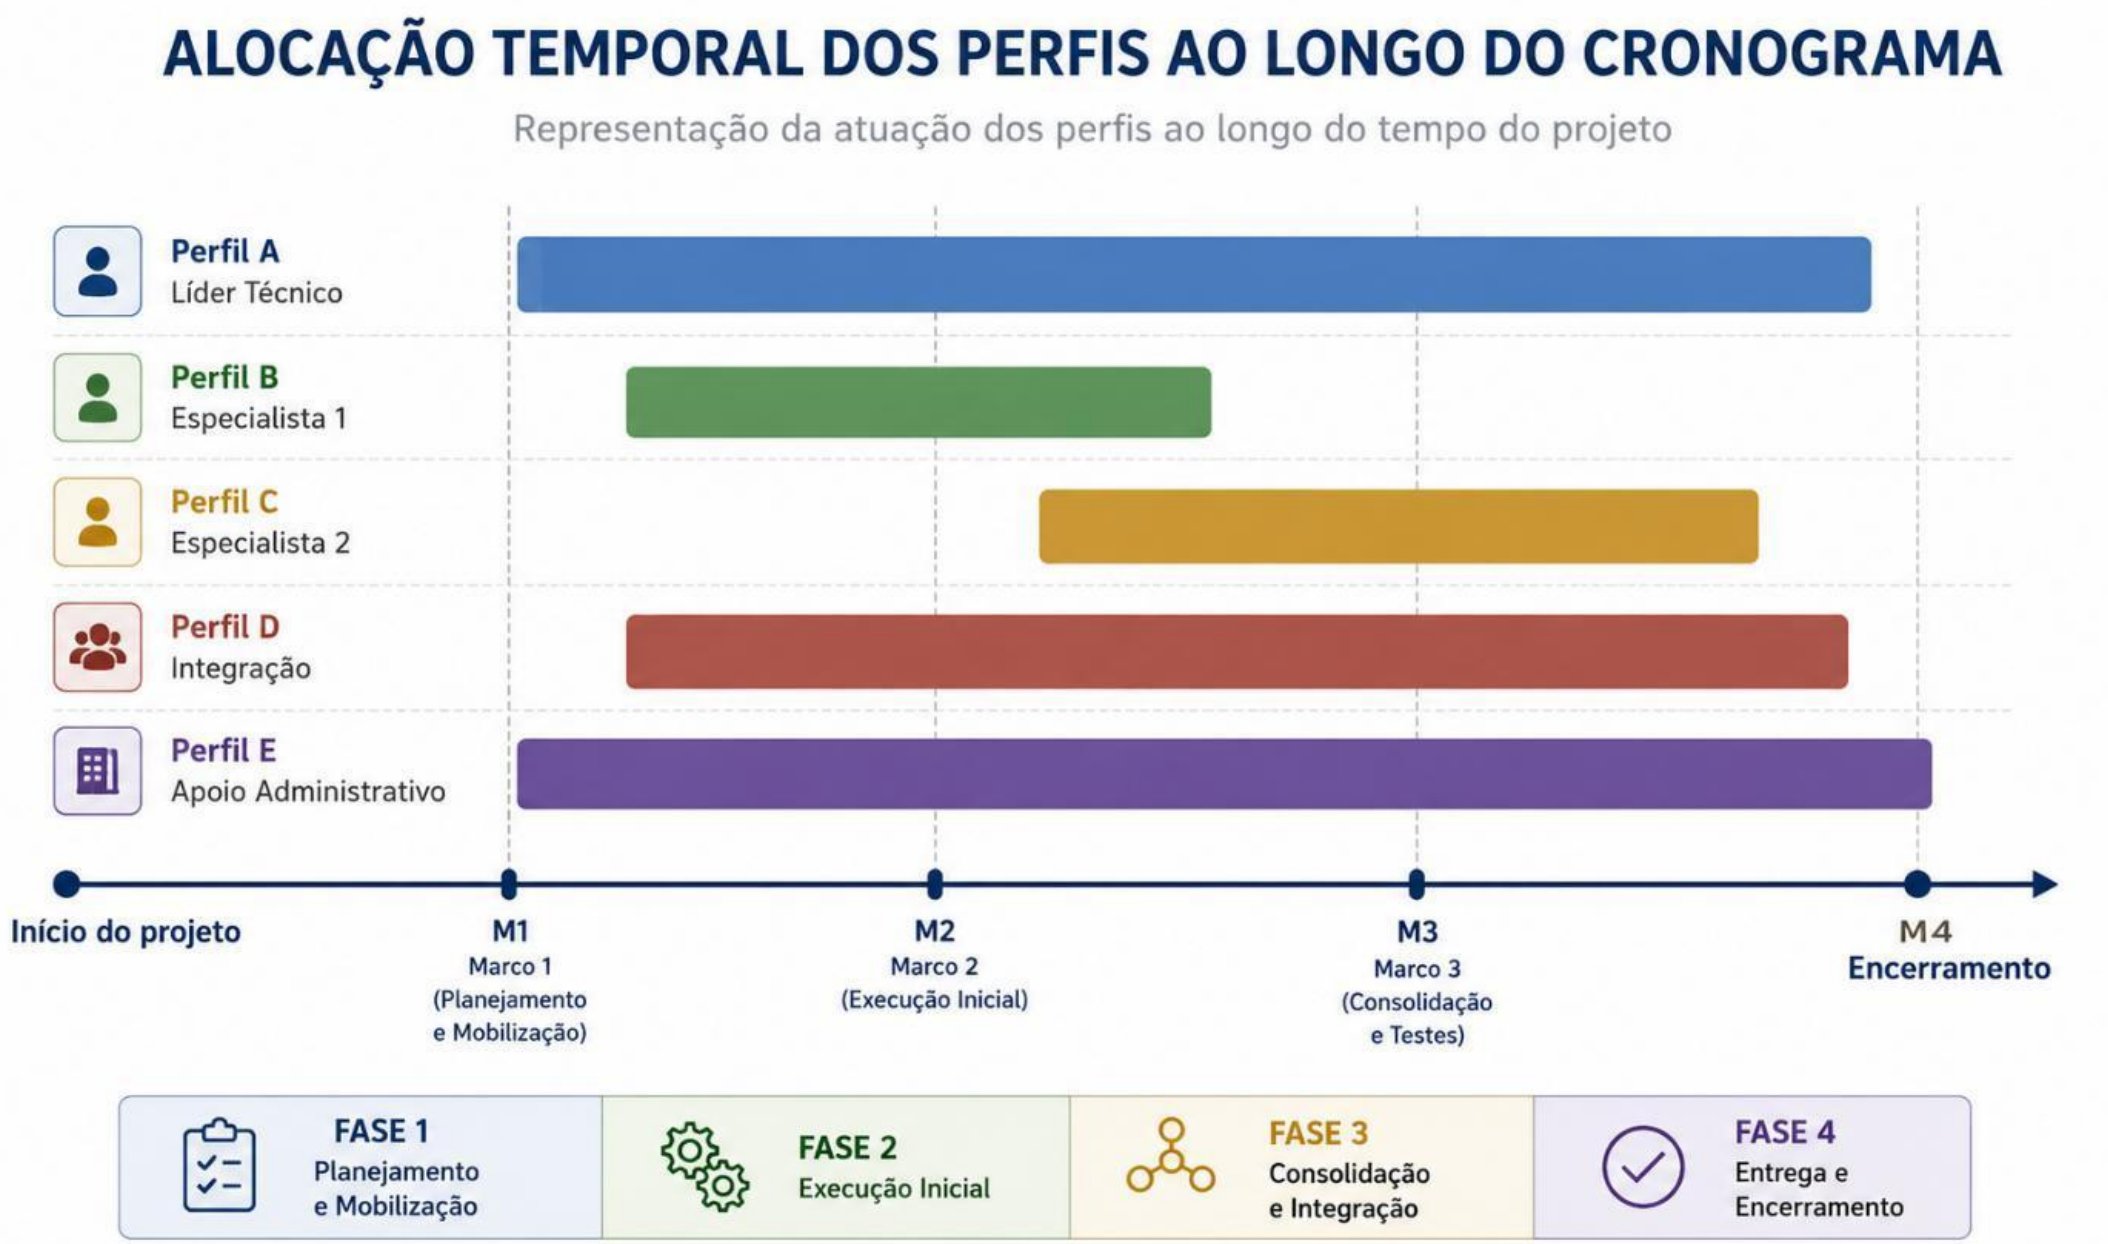

Estratégias de Mobilização e Contratação da Equipe

A forma de mobilização acompanha a necessidade

- Depois de definir os perfis e o período de alocação, o gerente avalia **como obter as competências**: equipe existente, contratação direta ou prestação de serviços.
- A escolha considera **duração do trabalho**, **disponibilidade no mercado**, **retenção de conhecimento** e **flexibilidade para ajustes**. **Custos** também influenciam a decisão.
- Em organizações matriciais, a disponibilidade de profissionais depende de **negociação com as áreas funcionais**. Uma necessidade planejada não garante alocação imediata.
- **Seleção**, **contratação** e **liberação** precisam de responsáveis, prazos e acompanhamento. A indisponibilidade de um perfil pode afetar diretamente o cronograma.
- Mobilização e desmobilização devem considerar o ciclo completo da equipe, inclusive transferência de conhecimento e os requisitos legais aplicáveis.

A alternativa escolhida só se torna viável quando seu prazo de mobilização entra no plano.
Com as pessoas previstas, falta explicitar o que cada posição faz e pode decidir.

Liderança Técnica e Equipes de Integração

Funções, responsabilidades e autoridade

- A **função** descreve o trabalho esperado de uma posição. A **responsabilidade** estabelece por quais atividades ou resultados ela responde.
- A **autoridade** define quais decisões essa posição pode tomar. Assumir uma responsabilidade sem a autoridade necessária cria dependências que precisam ficar claras.

Liderança Técnica e Equipes de Integração

Funções, responsabilidades e autoridade

Matriz RACI

Uma tabela que esclarece a participação de cada pessoa ou papel nas atividades e decisões de um projeto.

Letra	Significado	Pergunta que responde
R — **Responsible**	Quem executa o trabalho	Quem faz?
A — **Accountable**	Quem responde pelo resultado e tem autoridade para aprová-lo	Quem dá a palavra final?
C — **Consulted**	Quem fornece informações ou pareceres antes da decisão	Quem precisa ser ouvido?
I — **Informed**	Quem recebe informações sobre o andamento ou a decisão	Quem precisa saber?

Equipe de integração



Liderança Técnica e Equipes de Integração

- A equipe precisa de tempo para amadurecer

Competências Comportamentais e Atitudes

- As exigências comportamentais variam por função
- Comprometimento, colaboração e aprendizagem

Grau de Liberdade Gerencial na Composição da Equipe

- A autonomia depende do contexto organizacional

O MIPPE: Método Iterativo de Planejamento de Perfis e Equipes

O MIPPE integra as decisões de equipe

- Organiza a relação entre escopo, cronograma, competências e estrutura organizacional.
- Os pacotes de trabalho orientam a estrutura. Os perfis descrevem as competências das posições. O cronograma ajuda a dimensionar quantidade e período de alocação.
- O conjunto retorna ao planejamento para revisão: a equipe precisa ser compatível com o trabalho, e o trabalho precisa caber na capacidade da equipe.
- Os perfis precedem a seleção das pessoas.
- Cronograma e equipe são interdependentes – **gestão da integração**. Alterar atividades muda a demanda por recursos, enquanto alterar capacidade muda o cronograma viável.
- O planejamento evolui por revisões sucessivas e cobre mobilização, permanência e desmobilização. Sua consistência precisa se manter durante todo o ciclo da equipe.

MIPPE — MÉTODO DE PLANEJAMENTO DE PERFIS E EQUIPES

Planejar perfis. Alinhar pessoas. Entregar resultados.


PROCESSO ITERATIVO



CRONOGRAMA ⇄ EQUIPE

Cronograma e equipe são interdependentes.

CICLO DE VIDA DA EQUIPE



ⓘ O MIPPE orienta o planejamento de perfis e equipes de forma integrada, iterativa e alinhada aos objetivos do projeto.

Fluxo do MIPPE, com retroalimentação contínua ao planejamento



Comunicações e Gestão de Stakeholders

Informação precisa produzir entendimento compartilhado

Estrutura e responsabilidades só funcionam quando as pessoas recebem informações adequadas e compreendem o que elas significam para o trabalho.

Um relatório tecnicamente correto pode falhar se o receptor interpretar seus efeitos de outra forma. A comunicação gerencial precisa alinhar expectativas.

A ausência de informação favorece suposições e rumores. O plano de comunicações reduz esse vazio e organiza o fluxo necessário à coordenação.

O kick-off constrói uma compreensão comum sobre objetivos, organização e responsabilidades, assim como permite esclarecer incertezas antes do trabalho detalhado. As revisões de progresso acompanham mudanças, dependências e decisões pendentes. A frequência deve acompanhar a velocidade de mudança do projeto.

Esse fluxo começa com o alinhamento inicial e continua em revisões periódicas.

ARTEFATOS DA GESTÃO DE COMUNICAÇÕES E STAKEHOLDERS

Alinhar pessoas, informar com propósito, entregar resultados.

GESTÃO DE STAKEHOLDERS

Quem envolver e como engajar

1 REGISTRO DE STAKEHOLDERS
Identificar as partes interessadas do projeto.

2 MATRIZ PODER × INTERESSE
Avaliar poder e interesse para priorizar o relacionamento.

3 ESTRATÉGIA DE ENGAJAMENTO
Definir abordagem de comunicação e nível de envolvimento de cada parte.

4 REVISÃO PERIÓDICA
Atualizar informações e estratégias conforme o projeto evolui.

Entender as partes interessadas e planejar o relacionamento.

Alinhar expectativas e reduzir riscos de interpretações e suposições.

INFORMAÇÃO CERTA • PESSOA CERTA • MOMENTO CERTO

Comunicação eficaz gera alinhamento, confiança e resultados.

GESTÃO DAS COMUNICAÇÕES

O que, como e quando comunicar

1 PLANO DE COMUNICAÇÕES
Definir informações necessárias, públicos-alvo, meios, frequência e responsáveis.

2 KICK-OFF
Construir entendimento comum, alinhar expectativas, papéis e responsabilidades e antecipar incertezas.

3 RELATÓRIO DE STATUS
Comunicar situação do projeto, desvios, ações em andamento e decisões pendentes.

4 REVISÕES DE PROGRESSO
Acompanhar o desempenho e realinhar planos e compromissos.

Comunicar com clareza, frequência e propósito.

CICLO CONTÍNUO DE COMUNICAÇÕES E ENGAJAMENTO

1. IDENTIFICAR
Mapear e entender stakeholders.

2. PLANEJAR
Definir estratégia de engajamento e plano de comunicações.

3. COMUNICAR
Disseminar informações relevantes para cada público.

4. MONITORAR
Acompanhar respostas, resultados e eficácia da comunicação.

5. REVISAR
Ajustar planos, estratégias e abordagens conforme necessário.

O plano de comunicações evita o vácuo de informação. A gestão de stakeholders garante que cada parte receba a informação adequada às suas necessidades.

Equipes de projetos com Scrum

Competências coletivas e colaboração com o negócio

- A **multidisciplinaridade** pertence ao conjunto: os integrantes reúnem as competências para produzir um incremento, sem que cada um domine todas as especialidades.
- **Representantes do negócio** ajudam a descobrir necessidades, atualizar informações e priorizar o trabalho. Esse contato mantém as decisões próximas do valor esperado.
- Dependências com outras áreas exigem negociação. Barreiras que o time não consegue resolver demandam apoio para melhorar o fluxo de trabalho.
- Na Parte II de sua obra, Alexandre Magno discute a formação de times à medida que o projeto cresce. Mais pessoas ampliam as possibilidades e as dependências.
- Um **objetivo coletivo** precisa de condições que favoreçam a colaboração. Incentivos centrados apenas na produtividade individual podem enfraquecer esse comportamento.

O Scrum explicita responsabilidades complementares para organizar esse trabalho coletivo.

Product Owner

Responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho do Scrum Team.

Gestão eficaz do Product Backlog

1. Desenvolver e comunicar a Meta do Produto
2. Criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog



3. Ordenar os itens do Product Backlog
4. Assegurar um backlog transparente, visível e compreendido

Pode delegar atividades, mas continua responsável pelos resultados.

É uma pessoa, não um comitê. Pode representar as necessidades de vários stakeholders.

Fonte: Schwaber e Sutherland. Guia Scrum, novembro de 2020. Seção Product Owner. scrumguides.org/scrum-guide.html#product-owner

Scrum Master

Responsável por estabelecer o Scrum e pela eficácia do Scrum Team.

Ajuda pessoas e organização a compreender e aplicar o Scrum.

Apoio ao Scrum Team

- Desenvolver autogerenciamento e multifuncionalidade.
- Promover incrementos de valor que atendam à Definição de Pronto.
- Promover a remoção de impedimentos.
- Assegurar eventos produtivos e dentro do tempo previsto.

Apoio ao Product Owner

- Apoiar a Meta do Produto e a gestão do *Product* Backlog.
- Favorecer itens claros e planejamento empírico.
- Facilitar a colaboração com stakeholders.



Apoio à organização

- Orientar, treinar e apoiar a adoção do Scrum.
- Assessorar sua implementação.
- Promover o empirismo e remover barreiras entre stakeholders e times.

Liderança a serviço do time e da organização.

Fonte: Schwaber e Sutherland. Guia Scrum, novembro de 2020. Seção Scrum Master. scrumguides.org/scrum-guide.html#scrum-master

Scrum Team

Um time multifuncional e autogerenciável

Multifuncional

Reúne as competências necessárias para criar valor.

Autogerenciável

Decide internamente quem faz o quê, quando e como.



Tipicamente até 10 pessoas

Tamanho que favorece a comunicação e a colaboração.

Sem subequipes ou hierarquias internas

Um único time com foco compartilhado.

Competências complementares, decisões compartilhadas e um objetivo comum.

Fonte: Guia Scrum, 2020.

Equipes de projetos com Scrum

Autogerenciamento e qualidade do incremento

- A **Definição de Pronto** explicita os **critérios de qualidade do incremento**. Ela ajuda o time a distinguir trabalho em andamento de resultado utilizável.
- Magno utiliza a terminologia de 2019, com Development Team e auto-organização. O Guia de 2020 usa Developers e autogerenciamento.

Resultados e forma de trabalho geram aprendizagem

- Na Sprint Review, Scrum Team e stakeholders inspecionam os resultados e discutem adaptações que orientam a continuidade do produto.
- Na Sprint Retrospective, o time identifica melhorias para aumentar a qualidade e a eficácia de sua forma de trabalhar.
- Propósito claro e boa facilitação ajudam os eventos a produzir decisões. A disciplina de execução precisa resultar em incrementos efetivamente prontos.
