GESTÃO DE PROJETOS

Gestão de Pessoas e Equipes de Projeto

Unidade 6

Prof. Clayton J A Silva

A equipe na sequência da disciplina

- Fundamentos e governança orientam os objetivos e as decisões do projeto.
- Escopo e tempo definem entregas, atividades e competências necessárias.
- Scrum acrescenta priorização por valor e planejamento em ciclos curtos.

Planejamento da equipe e do trabalho

- A primeira pergunta é: quais competências as entregas exigem?
- Perfis, estrutura e responsabilidades orientam a escolha das pessoas.
- Cronograma e equipe evoluem juntos até formar um plano viável.

Conexões com os próximos conteúdos

- A alocação dos perfis sustenta a estimativa de custos e o orçamento.
- Lacunas de capacidade e dependências alimentam a análise de riscos.
- Responsabilidades e interfaces apoiam a qualidade e a integração.

Competência individual: modelo CHA

- **Conhecimento:** saber teórico e técnico acumulado.
- **Habilidade:** capacidade de aplicar o conhecimento na prática.
- **Atitude:** disposição para agir, colaborar e assumir responsabilidades.

Modelo CHA


CONHECIMENTO
Saber teórico
e técnico
HABILIDADE
Capacidade de
aplicar na prática
COMPETÊNCIA
INDIVIDUAL
ATITUDE
Disposição
comportamental

Perfil profissional e pessoa

- O perfil reúne competências técnicas e comportamentais para uma posição.
- O planejamento define o perfil antes de selecionar quem irá ocupá-lo.
- A necessidade do trabalho orienta a composição da equipe.

Avaliação e diversidade de competências

- Formação, certificações e experiência apoiam a avaliação técnica.
- Competências comportamentais exigem avaliação em situações concretas.
- Projetos multidisciplinares combinam especialidades que uma pessoa não reúne sozinha.


Organização pelas entregas do projeto

- Os pacotes de trabalho orientam o agrupamento das competências.
- Cada equipe assume um bloco coerente de trabalho.
- A estrutura explicita como especialidades diferentes se coordenam.

Três componentes da estrutura

- **Equipes técnicas:** especialidades e qualidade de cada bloco de trabalho.
- **Equipe de integração:** coerência entre disciplinas e interfaces.
- **Núcleo de gestão:** apoio ao gerente nas áreas de gestão do projeto.

Estrutura organizacional matricial

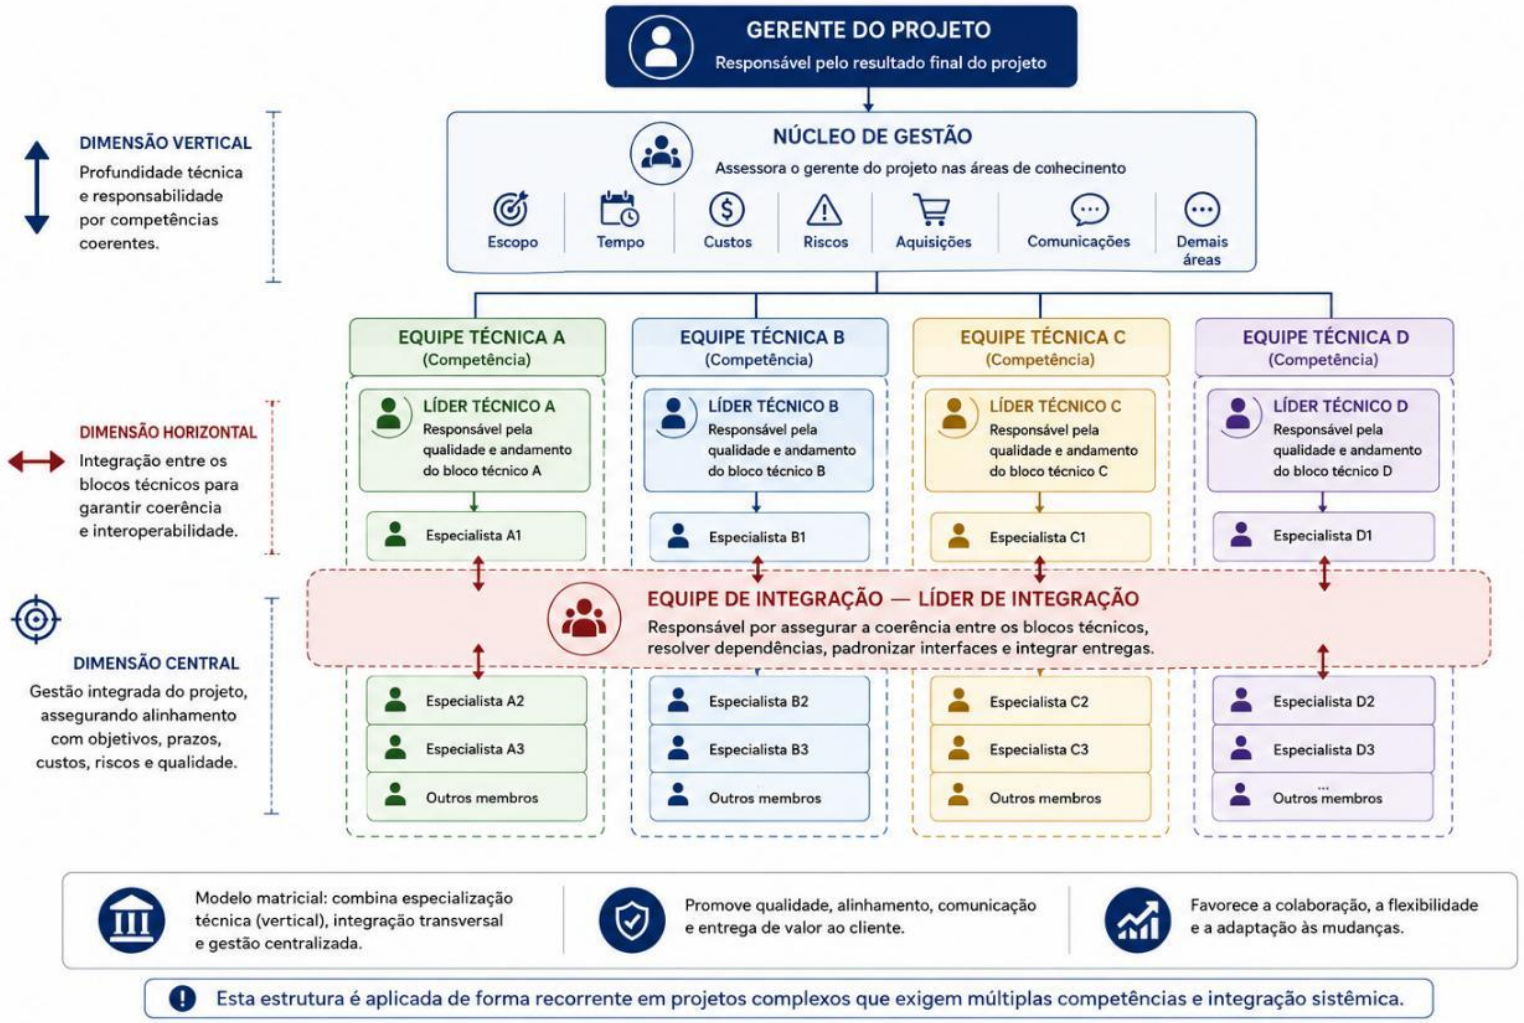


Interfaces e necessidade de coordenação

- A integração precisa de responsabilidade explícita na estrutura.
- As interseções entre sistemas revelam onde a coordenação exige mais atenção.
- A diversidade e a complexidade orientam o arranjo adequado a cada projeto.

Quantidade e momento de alocação

- A estrutura e os perfis precedem a decisão sobre quantas pessoas mobilizar.
- O cronograma indica quando cada perfil entra, permanece e sai.
- Mobilizar o perfil correto no momento errado também compromete o resultado.

Alocação temporal dos perfis

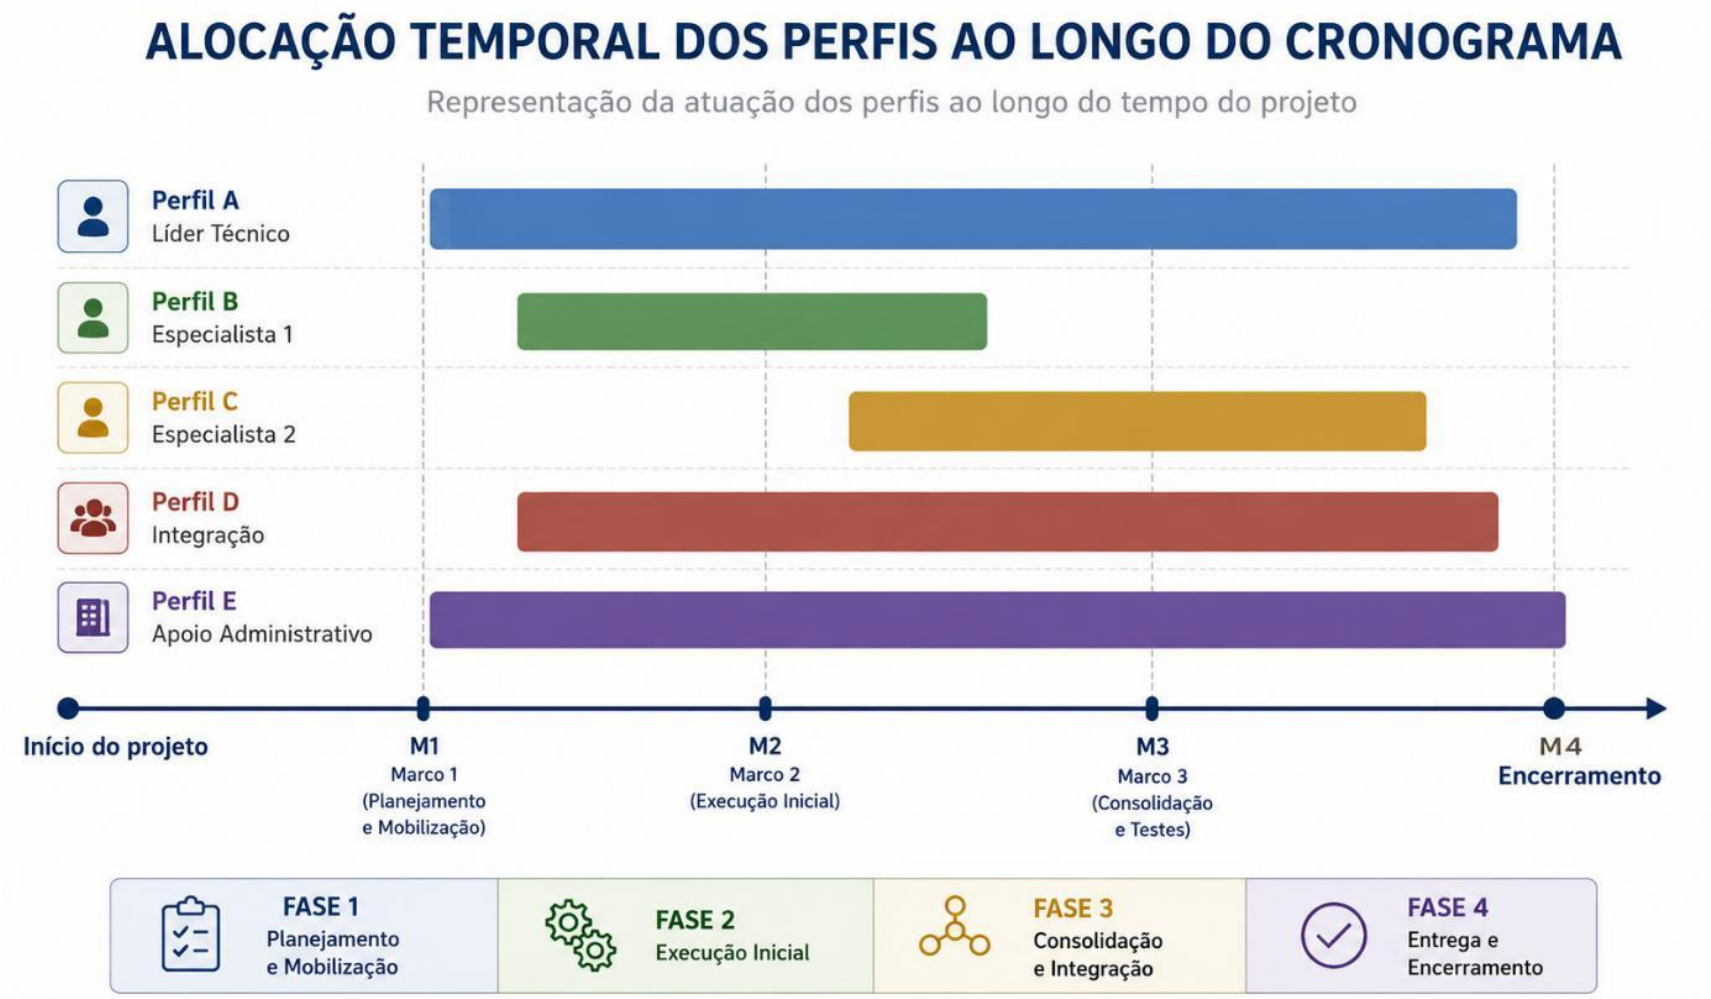

Estratégias de vínculo e mobilização

- Contratação direta, prazo determinado e prestação de serviços são alternativas.
- Duração, oferta de competências e retenção de conhecimento orientam a escolha.
- Custos e flexibilidade operacional também integram a decisão.

Mobilização como dependência do projeto

- A disponibilidade de pessoas depende de negociação com outras áreas.
- Seleção, contratação e liberação de profissionais precisam constar do planejamento.
- Mobilização e desmobilização exigem disciplina e observância da legislação aplicável.

Funções, responsabilidades e autoridade

- Cada posição precisa de funções e limites de autoridade claros.
- A matriz RACI pode apoiar a atribuição de responsabilidades.
- Estrutura, perfis, quantitativos e papéis precisam ser consistentes entre si.

Escolha e desenvolvimento das lideranças

- Excelência técnica e capacidade de liderar pessoas são competências distintas.
- O líder acompanha o trabalho e cria condições de colaboração.
- A escolha da liderança considera domínio técnico e competências interpessoais.

Responsabilidades da equipe de integração

- Acompanhar a evolução das equipes e as dependências entre seus resultados.
- Monitorar interfaces internas e externas e manter padrões técnicos comuns.
- Promover integração entre disciplinas conforme a complexidade do sistema.

Equipe de integração e interfaces



Maturação e eficácia da equipe

- Tuckman descreve formação, conflito, normatização e desempenho.
- Clareza de objetivos e composição adequada favorecem a eficácia coletiva.
- O cronograma precisa reservar tempo para a consolidação da equipe.

Competências conforme o papel

- Especialistas podem exigir maior rigor, organização e disciplina.
- Lideranças de integração exigem negociação, comunicação e visão sistêmica.
- A matriz de competências relaciona perfil, função e exigências de comportamento.

Colaboração e aprendizagem

- As competências comportamentais mobilizam conhecimento, habilidade e atitude.
- Comprometimento, colaboração e aprendizagem contínua atravessam a equipe.
- As exigências específicas variam conforme as responsabilidades de cada perfil.

Autonomia para compor a equipe

- A liberdade para contratar e substituir perfis varia entre organizações.
- Restrições institucionais podem limitar quantidade e qualificação disponíveis.
- O gerente ajusta o planejamento à autonomia efetiva para decidir.

Liderança em ambientes com restrições

- A menor flexibilidade de composição amplia a necessidade de negociação.
- Distribuição de responsabilidades e desenvolvimento aproveitam a equipe disponível.
- O esforço gerencial se concentra nas variáveis sobre as quais há influência.


Método Iterativo de Planejamento de Perfis e Equipes

- O MIPPE conecta escopo, cronograma e competências.
- A estrutura organizacional deriva dos pacotes de trabalho.
- Revisões sucessivas refinam a equipe e o planejamento do projeto.

Princípios do planejamento por perfis

- O escopo orienta as competências e os perfis necessários.
- A definição dos perfis precede a seleção das pessoas.
- Cronograma e equipe são interdependentes e evoluem por iterações.
- O planejamento cobre mobilização, permanência e desmobilização.

Planejamento de perfis e equipes

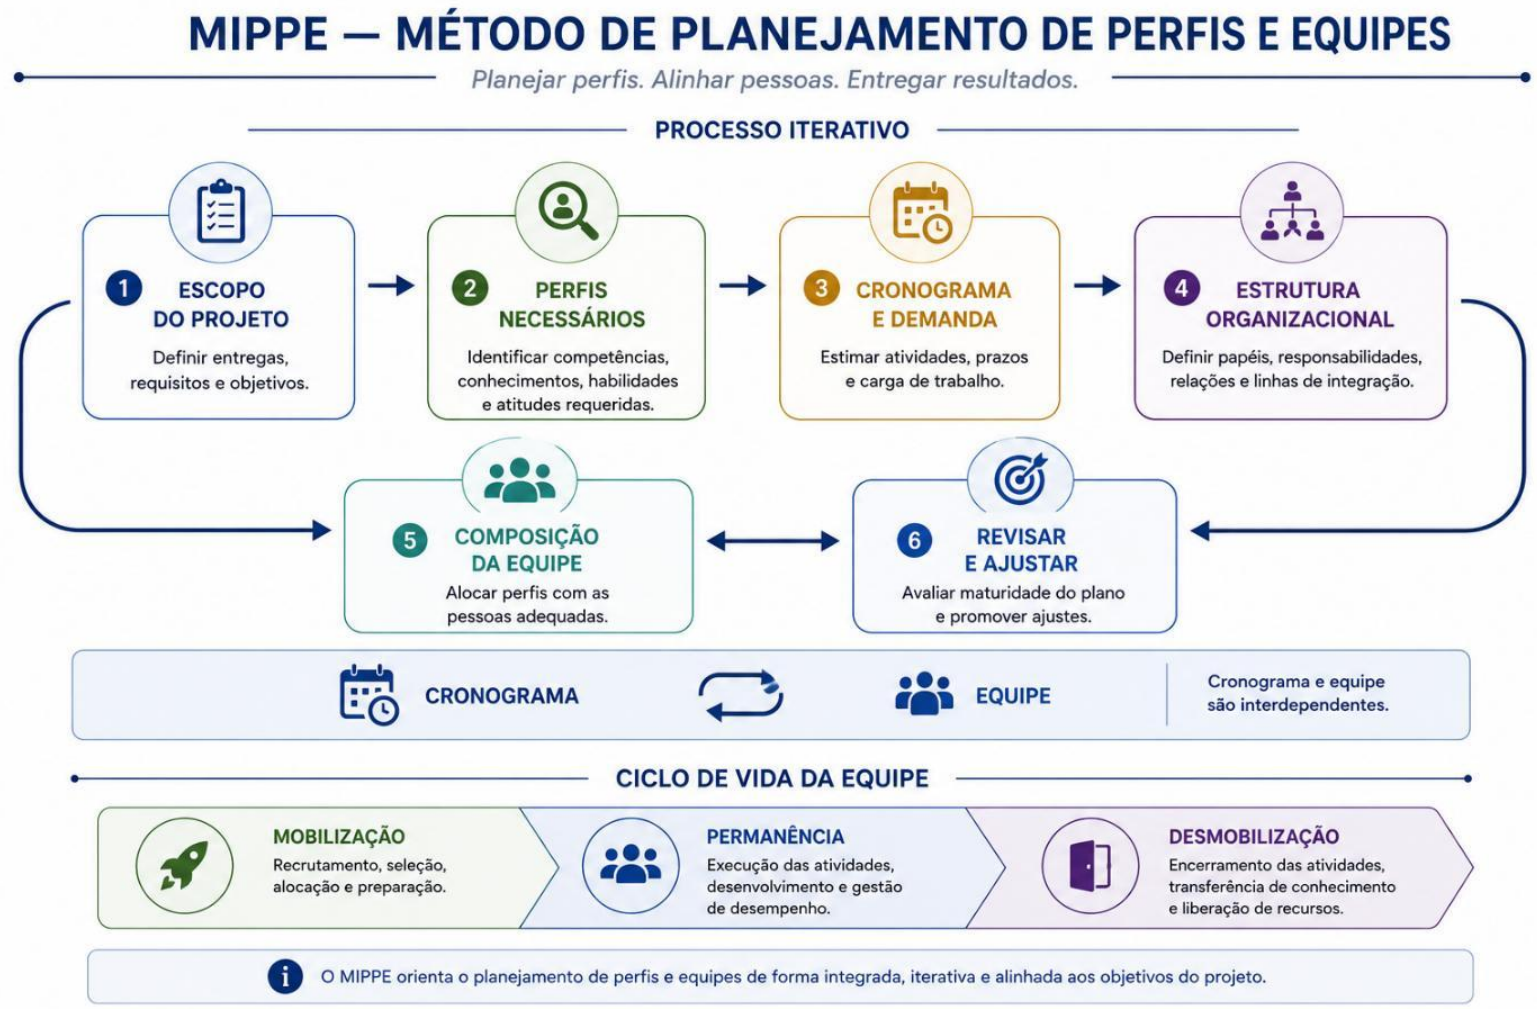

Etapas e realimentação do planejamento

- Escopo e pacotes de trabalho orientam a estrutura e os perfis.
- O cronograma orienta quantitativos, alocação, funções e autoridade.
- O confronto entre equipe e trabalho provoca novas revisões.
- A maturidade do conjunto sustenta a estimativa de custos.

Fluxo iterativo do planejamento



Comunicação como parte da liderança

- A equipe precisa de um fluxo de informação regular e estruturado.
- Transmitir informação exige verificar se houve entendimento compartilhado.
- A ausência de informação favorece suposições, rumores e expectativas divergentes.

Kick-off e revisões de progresso

- O kick-off alinha objetivos, papéis, responsabilidades e expectativas.
- As revisões acompanham mudanças, dependências e decisões necessárias.
- A frequência da comunicação acompanha a velocidade de mudança do projeto.

Relatório de status e interdependências

- O status compara a situação real com o plano do projeto.
- Desvios, ações em curso e decisões pendentes precisam aparecer com clareza.
- Relatórios dos fornecedores ajudam a revelar riscos entre subcontratos.

Relacionamento com as partes interessadas

- A identificação considera interesses, expectativas, poder e influência.
- A estratégia de comunicação se adapta às necessidades de cada parte.
- Negociação e leitura do contexto institucional integram a liderança.

Artefatos de comunicação e engajamento



Coerência do planejamento da equipe

- As competências exigidas pelas entregas orientam os perfis profissionais.
- Estrutura, quantitativos e responsabilidades organizam a realização do trabalho.
- Liderança e comunicação mantêm a coordenação ao longo do projeto.
- A equipe planejada sustenta o orçamento e as demais decisões de gestão.

Condições para construir um time

- Objetivos coletivos precisam de condições de trabalho que favoreçam a colaboração.
- Incentivos centrados no desempenho individual podem contrariar o trabalho em equipe.
- A definição de sucesso e os incrementos prontos orientam as competências necessárias.

Multidisciplinaridade e colaboração

- O conjunto da equipe reúne as competências para entregar o incremento.
- Representantes do negócio apoiam descoberta, atualização e priorização do trabalho.
- A negociação com outras áreas trata dependências e barreiras organizacionais.

Responsabilidades no Scrum Team

- **Product Owner:** maximizar o valor e responder pela gestão do Product Backlog.
- **Developers:** planejar, construir incrementos utilizáveis e adaptar o plano.
- **Scrum Master:** estabelecer o Scrum e favorecer a eficácia do time.

Autogerenciamento e qualidade

- O Scrum Team é multifuncional e autogerenciável, tipicamente com até dez pessoas.
- O time não possui subequipes ou hierarquias internas.
- A Definição de Pronto explicita os critérios de qualidade do incremento.
- O Guia de 2020 usa Developers e autogerenciamento. Magno usa a terminologia de 2019.

Planejamento e adaptação durante a Sprint

- **Sprint:** ciclo de um mês ou menos que contém os demais eventos.
- **Sprint Planning:** propósito, trabalho selecionado e plano de realização.
- **Daily Scrum:** Developers inspecionam a Meta da Sprint e adaptam o plano em 15 minutos.

Inspeção dos resultados e melhoria

- **Sprint Review:** time e stakeholders inspecionam os resultados e discutem adaptações.
- **Sprint Retrospective:** o time planeja melhorias de qualidade e eficácia.
- Reuniões com propósito e facilitação apoiam a entrega de incrementos prontos.

Atividade: portal de atendimento

- **Meta:** permitir que o usuário registre e acompanhe uma solicitação.
- Competências: atendimento, experiência do usuário, desenvolvimento, testes e segurança.
- A equipe identifica lacunas, combina disponibilidade e define critérios de qualidade.

Discussão: atraso no ambiente de testes

- O acesso ao ambiente depende de uma área externa à equipe.
- Como tratar essa dependência no planejamento e na negociação?
- Que ajustes de trabalho e capacidade preservam a Meta da Sprint?
- A conexão com o MIPPE é uma proposta didática para a atividade.

Equipes e Scrum

- MAGNO, Alexandre. Tire seu projeto do papel com Scrum. LeYa, 2019. Parte II.
- SCHWABER, Ken e SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum. Novembro de 2020.
- TUCKMAN, Bruce W. Developmental sequence in small groups. 1965.
- HACKMAN, J. Richard. Leading Teams. Harvard Business School Press, 2002.

Competências, organização e comunicações

- DURAND, Thomas. L’alchimie de la compétence. 2006. FLEURY e FLEURY. Construindo o conceito de competência. 2001.
- MINTZBERG, Henry. The Structuring of Organizations. 1979. PMI. PMBOK Guide. 7. ed., 2021.
- BOURNE, Lynda. Stakeholder Relationship Management. 2009. MENDELOW, Aubrey. Stakeholder mapping. 1991.
- SHANNON, Claude E. e WEAVER, Warren. The Mathematical Theory of Communication. 1949.
